



# Aménagement du centre-ville



## PHASE 2


# Planning des travaux 2012 Plans de circulation

## ► Phase 2 des travaux d'aménagement du centre-ville du 9 janvier au 4 mai 2012

- **Pendant les travaux, le centre-ville restera accessible à tous.**
- **Les travaux se feront de 8h à 17h.**
- **Les tranchées seront remblayées ou couvertes le soir.**
- **Les livraisons devront être effectuées avant 8h.**
- **Dans la journée, tous renseignements pourront être pris auprès du chef de chantier.**
- **Les parties en travaux seront accessibles aux piétons.**
- **La circulation sera modifiée selon les plans ci-après.**



### ► Etape 1 du 9 au 20 janvier 2012

**Partie nord de la rue Lescot :**  
**Reprise des branchements**  
**d'assainissement et d'eau potable.**

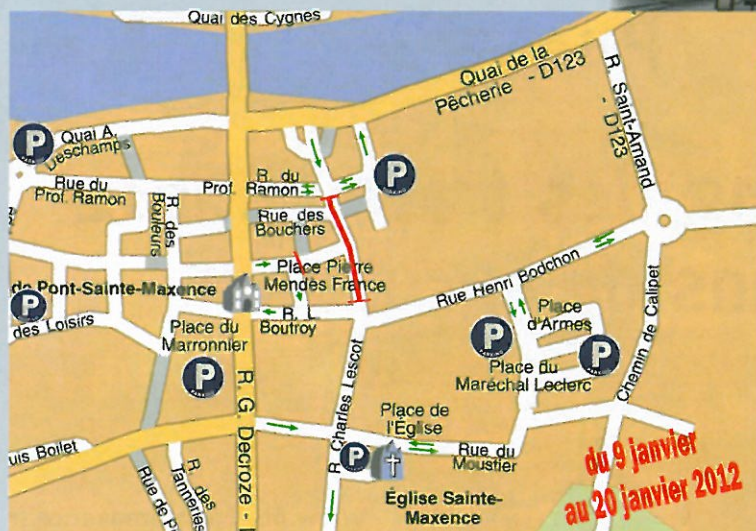

## ► Etape 2 du 23 janvier au 24 février 2012

**Rue Charbonnier-de-Belloy : Mise en séparatif des réseaux d'assainissement et reprise des branchements eaux usées.**

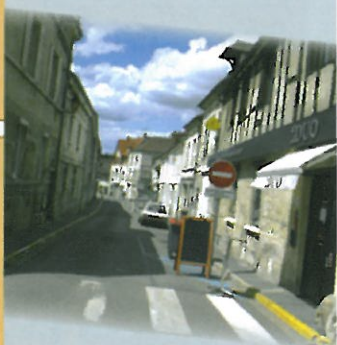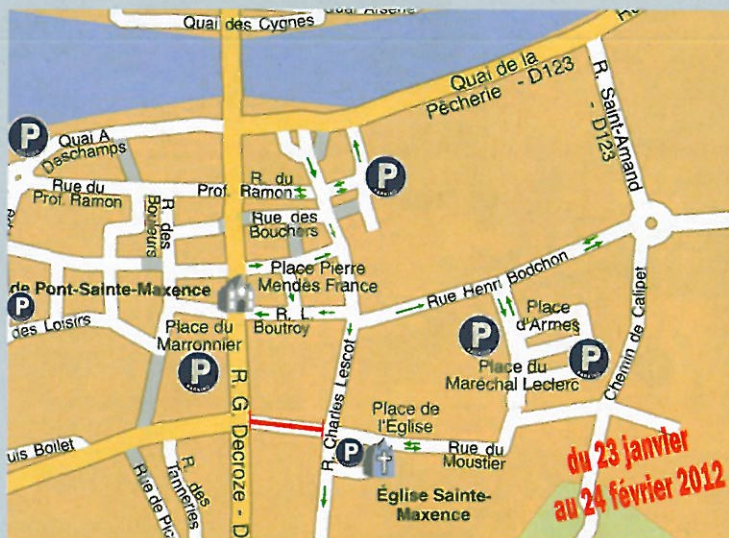

## ► Etape 3 du 27 février au 2 mars 2012

**Carrefour des rues Lescot et Charbonnier-de-Belloy : Mise en séparatif des réseaux d'assainissement.**



**Travaux réalisés pendant les vacances scolaires.**



